UTN FRLP

Desarrollo de Software 2026

Scrum + Trello

Clase #07 - 11 de mayo del 2026

Matías Corti - Martina García Améndola

¿Cómo nos organizamos a partir de ahora?

Tienen un backlog... ¿Y ahora?

- 6-7 personas
- Historias de usuario sin orden claro
- 3 entregas más en el año
- Un cliente real esperando
- Comienzan el Frontend en 1 semana, el Backend en 2 meses

¿Cómo evitan que esto se vuelva un caos?

Del modelo en cascada a la agilidad



Retomando conceptos de la clase #3

Modelo en Cascada

- Secuencial y rígido
- Documentación exhaustiva
- Resistente al cambio
- Feedback tardío del cliente

Problemas

- Requisitos cambiantes
- Alto riesgo al final del proyecto
- Baja visibilidad del progreso real
- Expectativas vs. realidad

Beneficios del Enfoque Ágil

- Mayor satisfacción del cliente
- Adaptación rápida a cambios
- Entrega constante de valor
- Mejor calidad del producto
- Mayor visibilidad y transparencia
- Reducción de riesgos
- Mejor ambiente de trabajo

Metodologías Ágiles Populares

Scrum

- Marco de trabajo para proyectos complejos
- Enfoque en roles, eventos y artefactos

Kanban

- Sistema visual de gestión del trabajo
- Flujo continuo y límite de trabajo en curso

XP (Extreme Programming)


- Prácticas técnicas específicas
- TDD, programación en pares, integración continua

SCRUM

Marco de trabajo para desarrollo ágil

SCRUM

Marco de trabajo para desarrollo ágil

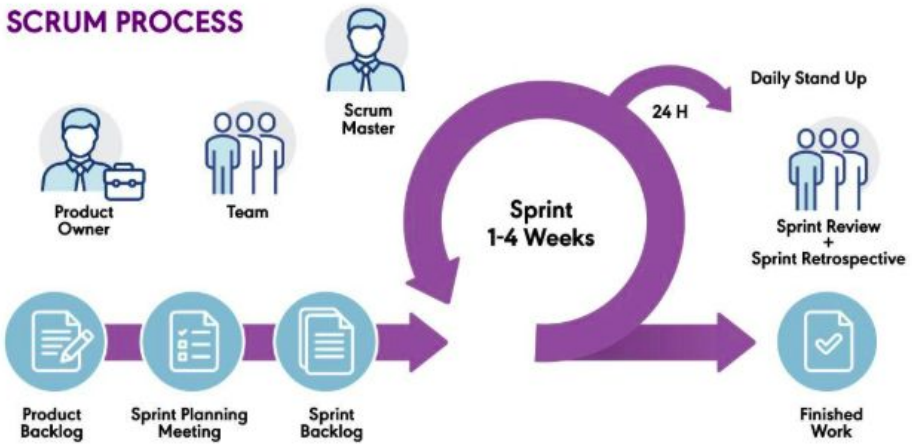


NO es una metodología completa sino un **marco de trabajo** dentro del cual pueden emplearse varias técnicas y procesos

Utiliza un **enfoque iterativo e incremental** para optimizar la previsibilidad y controlar el riesgo.

Los tres pilares de Scrum son: **transparencia, inspección y adaptación.**

Roles en Scrum

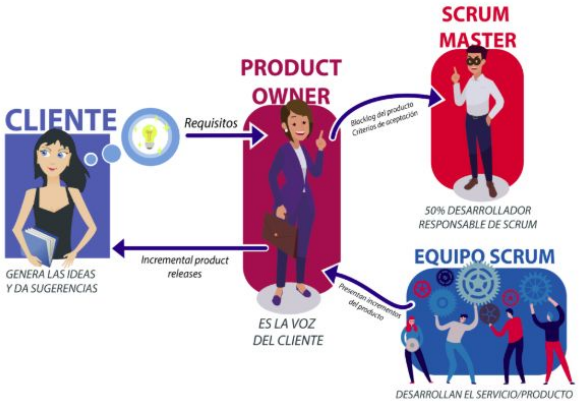

Product Owner

- Representa al cliente/negocio
- Gestiona el Product Backlog
- Define prioridades y criterios de aceptación

Scrum Master

- Facilita el proceso
- Elimina impedimentos
- Asegura adherencia a Scrum

Equipo de Desarrollo

- Multifuncional y auto-organizado
- Responsable de entregar incrementos funcionales
- Normalmente 3 a 9 personas

Artefactos de Scrum



Product Backlog

- Lista ordenada de todo el trabajo
- Evoluciona constantemente
- Priorizado por valor de negocio

Sprint Backlog

- Conjunto de elementos del Product Backlog seleccionados para el Sprint
- Plan para entregar incremento funcional

Incremento

- Suma de todos los elementos completados
- Debe estar "Terminado" (Done)

Eventos de Scrum



Sprint

Es un período de tiempo fijo, durante el cual un equipo de desarrollo trabaja para entregar un incremento de producto "terminado". Su resultado es el incremento "terminado"

- Cada Sprint tiene un objetivo claro
- No se realizan cambios que pongan en peligro el objetivo
- Proporciona predictibilidad al asegurar inspección y adaptación
- Duración fija (1-4 semanas), en general 2 semanas

Sprint Planning

Reunión clave al inicio de cada sprint donde el equipo decide qué trabajo realizar y cómo hacerlo.

Es un evento **colaborativo** que define el **objetivo** del sprint, selecciona **ítems del Product Backlog**, y planea las tareas necesarias para lograr el **incremento de producto**.

- El Product Owner presenta los elementos prioritarios
- El equipo selecciona cuánto puede comprometerse a completar

Eventos de Scrum



Daily Scrum

Reunión diaria de 15 minutos para sincronización

- Se realiza a la misma hora y lugar cada día
- Cada miembro responde: **¿Qué hice ayer? ¿Qué haré hoy? ¿Tengo impedimentos?**
- No es una reunión de reporte al Scrum Master, sino de colaboración del equipo
- Mejora la comunicación, identifica obstáculos y promueve toma de decisiones rápidas

Sprint Review (Demostración)

Al final del Sprint, se revisa el incremento.

- Demostración del trabajo completado
- Recolección de feedback de stakeholders

Sprint Retrospective

Oportunidad para el equipo de inspeccionarse a sí mismo.

- Se analiza: ¿Qué salió bien? ¿Qué podría mejorar? ¿Qué vamos a cambiar?
- Se crea un plan de mejoras para implementar en el siguiente Sprint

¿Cómo vamos a implementar Scrum en el curso?

Roles

- **Product Owner:** uno de ustedes será el puente con el cliente (pueden rotarlo en cada sprint).
- **Scrum Master:** no habrá uno dedicado, reparten la función o asignan a alguien que además de desarrollar coordine.

Eventos

- **Sprint Planning:** al inicio de cada sprint (2 semanas).
- **Daily Scrum:** recomendado sea o no diario, al menos un par de veces por semana (interno del equipo).
- **Sprint Review:** al finalizar el sprint, lo harán ustedes con el cliente.
- **Retrospectiva:** al finalizar el sprint, lo harán ustedes y subirán resultados al repositorio.

Sprints de 2 semanas

¿Por qué 2 semanas?

- Estándar de la industria
- Suficiente para entregar algo concreto
- Corto para corregir rumbo si va mal
- Encaja con el ritmo de cursada (~2 clases por sprint)

Reglas del sprint:

✋ Lo que entra, no se cambia a mitad
🎯 Objetivo claro y compartido (1 oración)
📦 Incremento "Listo" al final, no a medias

Lo que esperamos y lo que NO

✅ Esperamos	❌ NO esperamos
Sprint en curso SIEMPRE cargado en Trello	Que usen Scrum completo al pie de la letra
Tarjetas con responsable y estado actualizado SIEMPRE	Scrum Master dedicado
Movimiento del tablero en la semana	Daily Scrum todos los días
Auto-organización del equipo	Reuniones de 2 horas
Cumplir con los compromisos del sprint	Que estimen perfecto desde el día 1

🎯 Trello es la fuente de verdad.

Si no está ahí, no existe...

RESUMEN

- Trabajamos en sprints de **2 semanas**
- Cada sprint arranca con un **Planning**
- Cliente = **PO**
- Equipo = **autogestionado**
- **Trello** es la fuente de verdad
- Lo que entra al sprint, **no se cambia**
- Los **objetivos** del sprint, **SE CUMPLEN!**

De backlog a Sprint Planning

Sprint Planning responde 3 preguntas

1. ¿**Qué** entra en el sprint?

   → **prioridad**

2. ¿**Cuánto** entra?

   → **estimación** + **capacidad**

3. ¿**Cuándo** está "terminado"?

   → Definición de "**Done**"

El **input** de la Planning es el **backlog priorizado**

El **output** es el **Sprint Backlog**: subconjunto + plan

Priorizar: ¿qué entra primero?

Criterios para priorizar

🎯 Valor para el cliente

¿Qué resuelve un "dolor" real?

🧱 Dependencias

¿Esto bloquea otras historias?

🚀 Riesgo / Aprendizaje

¿Algo nuevo que conviene atacar antes?

🪜 Esfuerzo

Entre dos de igual valor, primero el más chico

📚 Calendario de Clases

No prioricen tareas de temas que aún no vimos

El calendario mostrará el orden de los temas

💡 **Tip**

Si todo es "alta prioridad", nada es prioritario.

Tareas que cruzan bloques

Bloque	Foco
B2 (Ahora)	Pantalla, formulario, navegación, datos mock
B3	Endpoints, lógica, persistencia, validación back
Integración (B3 final)	Conectar front al back real
SP4	Auth, permisos, deploy, tests

En Trello:

- Cada tarea que carguen referencia la HU general (en descripción y/o link a su backlog)
- Una HU puede tener varias tarjetas a lo largo del año
- Ejemplo:
  "FT-Front: Pantalla de préstamo (mock)"
  "BK: Endpoint POST /prestamos"

Ejemplo

[HU-004] Solicitar préstamo de libro

Feature: Solicitar préstamo de libro disponible,

Scenario: Solicitud exitosa con cupo disponible, límite de préstamos

Given el usuario tiene menos de 3 préstamos activos

And el usuario no tiene multas pendientes

And el libro tiene ejemplares disponibles


When el usuario solicita el préstamo


Then se crea un préstamo en la BD, considerar transacciones para

And el ejemplar pasa a estado "prestado"


And se muestra un mensaje de confirmación

Archivo: "HU-004_Solicitar_prestamo.pdf"

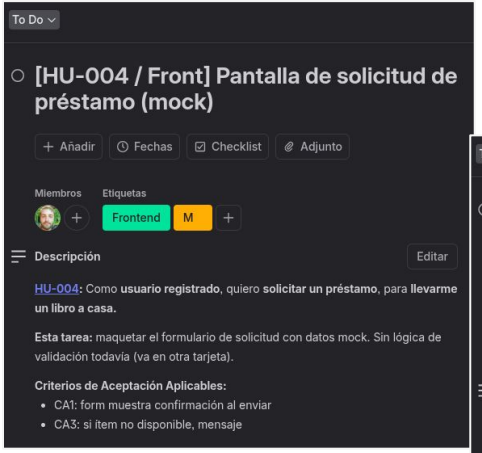

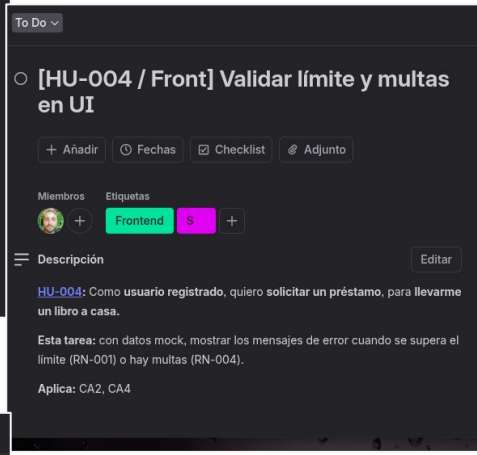



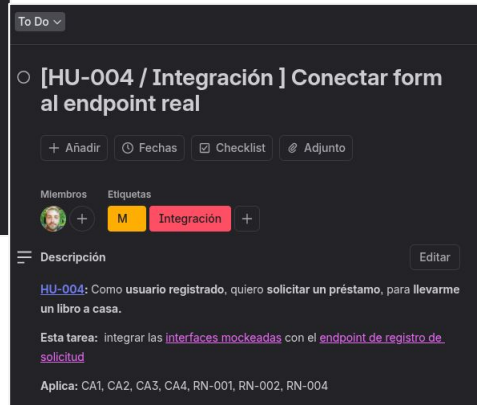

Sprints de B2
Calendario

Sprint	Período	Foco
SP1	11/05/2026 24/05/2026	Planificación detallada. Crear proyecto React+TS. Primeros componentes.
SP2	25/05/2026 07/06/2026	Layout con librería UI, menú y páginas principales.
SP3	08/06/2026 21/06/2026	Navegación completa y formularios básicos.
SP4	22/06/2026 05/07/2026	Validaciones en formularios APIs con mocks.

🎯 **Entrega 2:** Domingo 5/7 – Frontend funcional, validaciones, navegación, datos mock.

Trello

1. Si no tienen cuenta, crear una individual → trello.com/signup
2. Un miembro del equipo crea el tablero del grupo, por ejemplo: "UTN DS26 - Grupo ##"
3. Invitar a los demás miembros del equipo y a los docentes mcorti@freelogic.com.ar y martina.garcia@alu.frlp.utn.edu.ar
4. Crear listas mínimas: **To Do → Doing → Review → Done**
5. Cargar el Sprint Backlog seleccionado (cada historia/tarea = 1 tarjeta)
6. Asignar responsables y estimar

Actividades de la semana

Actividad individual de la semana

Hasta el **17/05/2026**
(inclusive)

[AI-C07 - Encuesta Bloque 1]
Completar Encuesta de Cierre del Bloque 1

Ingresar y completar la encuesta de satisfacción del Bloque 1, es anónima y rápida, nos permite medir y mejorar el dictado de la materia.

Una vez completada, notificar en Discord un mensaje en el canal **#actividades**, dentro del Hilo: ***"[AI-C07] – Encuesta Bloque 1".***

Actividad grupal de la semana

Hasta el **17/05/2026** (inclusive)

[AG-C07 - Sprint 1 en Trello]

1. Ordenar el backlog del proyecto según planeen ejecutarlo y actualizarlo en el repositorio.

2. Crear tablero de Trello del equipo, con todos los miembros adheridos. Dar acceso también a los docentes (mcorti@freelogic.com.ar y martina.garcia@alu.frlp.utn.edu.ar).

3. Agregar las listas básicas:
   To Do → Doing → Review → Done

4. Cargar en "**To Do**" las tareas seleccionadas para el **Sprint 1**: historias, responsables, estimación, objetivo. El resto queda en el repositorio.

5. Comunicar la finalización en Discord en un mensaje único por equipo, **indicando el Link del tablero**, dentro del canal #actividades, en el Hilo: *"[AG-C07] Sprint 1 en Trello"*.
